OFFRE COMPÉTITIVE

68 062 TND HT - prix ferme - en service en 8 semaines

Plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4 - Tunisie Telecom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie

Le prix est bas parce que la plateforme existe déjà : elle est livrée avec son code source complet, ses 140 tests automatisés, sa documentation et ses scripts de déploiement. Vous ne payez ni la conception ni le développement : vous payez l'installation, l'intégration avec les trois opérateurs, la recette, la mise en production et la formation.

Charge	113 jours-homme sur 8 semaines
Main-d'œuvre (taux bas du marché)	62 440 TND
Aléas (5 %)	3 122 TND
Préproduction et déplacements	2 500 TND
TOTAL HT - PRIX FERME	**68 062 TND**
TVA 19 %	12 932 TND
TOTAL TTC	**80 994 TND**
Coût moyen par jour-homme (hors aléas)	553 TND

Pourquoi cette offre est la plus compétitive

• 71 % moins cher qu'une réalisation depuis zéro en 2 mois (236 010 TND HT) : le développement est déjà fait.

• Coût moyen de 553 TND par jour, sous la fourchette de 700 à 1 200 TND/jour d'une agence full-stack à Tunis.

• Prix ferme et plafonné : aucun dépassement facturé pour le périmètre décrit ; paiement lié à des livrables vérifiables.

• Équipe réduite et senior : peu d'intervenants, moins de coordination, délais courts ; travail à distance sauf ateliers opérateurs.

• Aucune licence : pile 100 % open source, code source remis, aucun verrouillage.


• Garantie de 6 mois sur les anomalies, incluse (3 mois dans nos offres précédentes).

Ce que ce prix suppose : la plateforme livrée a été validée de bout en bout contre un simulateur d'opérateur, pas contre un vrai opérateur. Le calendrier de la recette réelle dépend des accès (VPN, comptes SMPP, jeux de tests) que chaque opérateur doit fournir ; il n'influence pas le prix.

1. Bordereau de prix par lot

Lot	JH	Prix HT (TND)	Contenu
1. Cadrage et paramétrage opérateurs	6	4 200	Ateliers avec chaque opérateur, fiche de paramétrage (SMPP, TPS, règles DLR, short codes), plan de recette.
2. Déploiement préproduction et production	7	4 400	Pile conteneurisée, TLS, secrets et clé de chiffrement, sauvegardes GPG, supervision et alertes, haute disponibilité de base.
3. Intégration et recette Tunisie Telecom	7	3 840	Provisionnement Jasmin, bind SMPP, formats d'accusés réels, jeux de tests opérateur.
4. Intégration et recette Orange Tunisie	5	2 820	Réutilise le socle validé avec le premier opérateur.
5. Intégration et recette Ooredoo Tunisie	5	2 820	Idem.
6. Données réelles : plages, portabilité, relevés	7	3 750	Import des plages de numéros et des numéros portés, adaptation du rapprochement aux relevés réels.
7. Paramétrage métier et finitions client	6	2 700	Services initiaux, tarifs, textes des réponses FR/AR, identité visuelle, comptes et rôles.
8. Tests de charge, recette client et corrections	10	4 800	Charge sur l'infrastructure fournie, recette utilisateur, correction des anomalies, PV de recette.
9. Revue de sécurité et durcissement	4	2 600	Revue des configurations, contrôle des accès, rotation de clés, préparation au test d'intrusion.
10. Formation, documentation, transfert	4	2 320	2 jours de formation, documentation à jour, PV de transfert.
11. Mise en production et suivi renforcé (2 semaines)	7	4 300	Bascule, surveillance rapprochée, correction à chaud, transfert des accès.
13. Options : USSD, IVR, DCB, WhatsApp / RCS, serveur SMPP, antifraude, BI, applications mobiles	41	21 090	Modules livrés et testés : raccordement aux passerelles USSD / DCB / vocales des opérateurs, comptes WhatsApp et RCS, ouverture du serveur SMPP aux partenaires, calibrage antifraude, entrepôt et outil BI, publication des applications ; recette de chaque option dès que son contrat est disponible.
12. Pilotage de projet	4	2 800	Comité hebdomadaire, suivi des dépendances opérateurs.
Aléas (5 % de la main-d'œuvre)	-	3 122	Provision pour imprévus.
Frais non salariaux	-	2 500	Environnement de préproduction hébergé (2 mois) : 1 500 ; Déplacements et ateliers sur site : 1 000
TOTAL HT	**113**	**68 062**	TVA 12 932 - TTC 80 994 TND

2. Planning sur 8 semaines

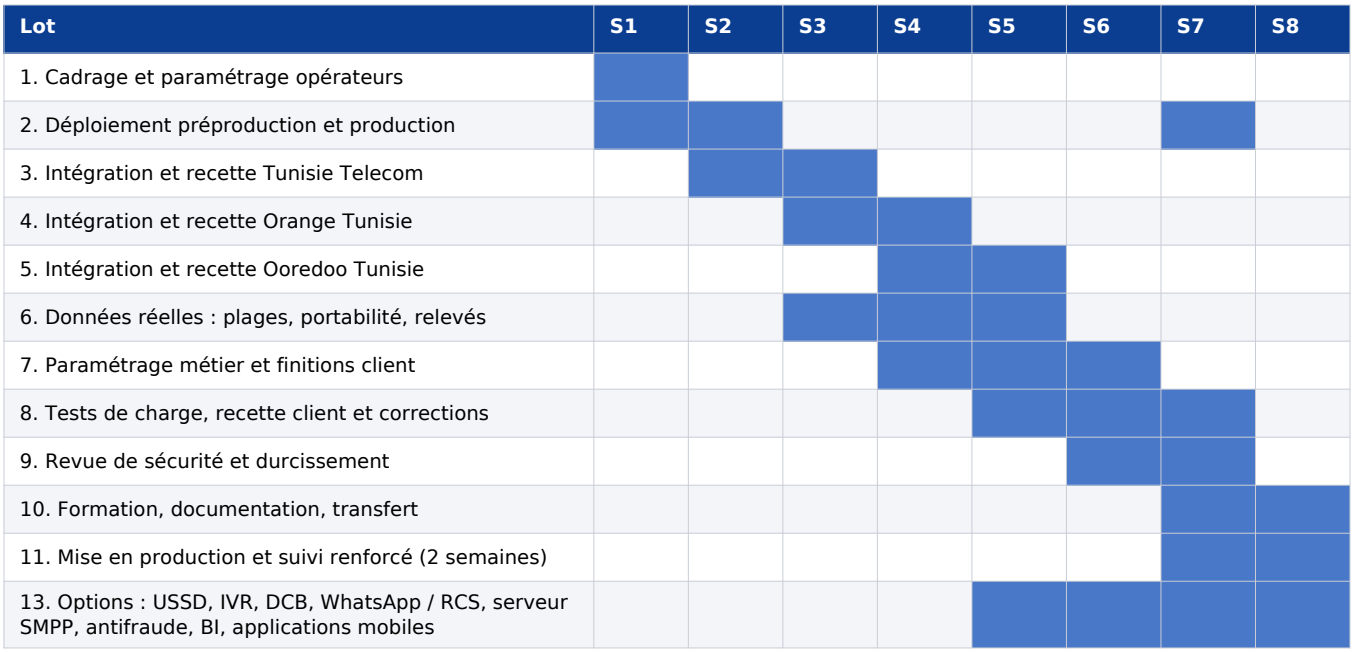

Lot	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
12. Pilotage de projet								

Les semaines 3 à 5 dépendent des délais de chaque opérateur ; l'ordre des intégrations peut être adapté à leur disponibilité sans changer le prix.

3. Équipe et taux

Profil	JH	Taux HT (TND/JH)	Coût HT (TND)	Repère de marché Tunis 2026
Architecte / Tech lead	4	800	3 200	900 - 1 400 (grille publiée)
Développeur backend senior	41	600	24 600	500 - 900 (grille publiée)
Développeur confirmé	16	450	7 200	450 - 650 (grille publiée)
Ingénieur DevOps / SRE	18	600	10 800	non publié : estimation interne
Ingénieur QA / test	22	420	9 240	non publié : estimation interne
Chef de projet	8	700	5 600	non publié : estimation interne
UX / UI designer	4	450	1 800	non publié : estimation interne
Total	**113**		**62 440**	

Les taux sont retenus au bas de la fourchette du marché (développeur senior à 600 TND contre 500 - 900 publiés ; le taux de l'architecte, à 800 TND, est volontairement sous le bas de la grille publiée : 900) en échange d'un engagement ferme, d'une équipe réduite et d'un volume garanti. Source des fourchettes : article « TJM développeur application web Tunis 2026 », blog Kolonell (kolonell.com/fr/blog/tjm-developpeur-application-web-tunis-2026), source unique d'une agence, indicative ; aucun baromètre officiel tunisien n'existe. Les taux des autres profils sont des estimations internes.

4. Positionnement par rapport aux alternatives

Option	Prix HT (TND)	Délai	Remarque
Cette offre : plateforme existante + mise en service	68 062	8 sem.	Code, tests et documentation déjà livrés ; reste l'intégration réelle.
Offre plafonnée précédente (finalisation sur 16 semaines)	69 720	16 sem.	Même base, étalée sur plus longtemps, avec une équipe plus petite.
Réalisation complète depuis zéro en 2 mois	236 010	8 sem.	11 personnes en parallèle ; développement des options inclus.
Agence full-stack, 700 - 1 200 TND/jour, même charge de développement	≥ 190 000	variable	Estimation : charge de la réalisation depuis zéro (270 JH) au bas de la fourchette d'agence.

Remarque : le montant de l'offre précédente (16 semaines, 69 720 TND) est plus élevé que celui-ci pour une durée double parce qu'il intégrait des finalisations fonctionnelles depuis réalisées dans la plateforme.

5. Échéancier de paiement

Jalon	%	Montant HT (TND)	Montant TTC (TND)
Commande et démarrage	30 %	20 419	24 298
Intégration réussie avec le premier opérateur (bind et flux de test validés)	25 %	17 016	20 248
PV de recette signé	25 %	17 016	20 248
Mise en production et PV de transfert	15 %	10 209	12 149
Fin du suivi renforcé de 2 semaines	5 %	3 403	4 050
Total	**100 %**	**68 062**	**80 994**

6. Hors périmètre et options

Poste	Estimation HT (TND)	Commentaire
Test d'intrusion externe	9 000 - 15 000	Prestataire indépendant, sur devis.
Haute disponibilité multi-sites (réplication, cluster, bascule)	7 200	12 JH DevOps, hors infrastructure.
Test de charge à 200 SMS/s sur l'infrastructure finale	4 320	9 JH ; nécessite l'infrastructure cible et les opérateurs.
Maintenance et support après la garantie	3 315 / mois	≈ 6 JH par mois ; astreinte 24/7 sur devis.
Évolutions hors périmètre	553 / JH	Au coût moyen pondéré de cette offre, sur bon de commande.
Hébergement production, VPN, short codes, frais opérateurs, conseil juridique, SMS de test	client	Facturés directement au client par les tiers.
Licences logicielles	0	Pile 100 % open source.

7. Engagements, hypothèses et risques

Point	Engagement / risque	Parade
Prix et périmètre	Prix ferme pour le périmètre ci-dessus ; une demande hors périmètre fait l'objet d'un avenant, jamais d'un dépassement non annoncé.	Comité hebdomadaire, backlog arbitré par le client.
Garantie	6 mois sur les anomalies de la livraison, corrections sans frais.	Suivi des anomalies avec priorités et délais.
Accès opérateurs (VPN, comptes SMPP, jeux de tests)	Hors du contrôle du prestataire : peut décaler la recette réelle, pas le prix.	Intégrations enchaînées selon la disponibilité de chacun.
Formats d'accusés et de relevés propres à chaque opérateur	Adaptations possibles après les premiers essais réels, incluses dans le lot 6.	Mappings de colonnes paramétrables.
Messages longs : accusé final perdu par intermittence constaté avec le simulateur	À requalifier avec chaque opérateur en recette ; sans accusé, le message est marqué inconnu et sa facturation contestée.	Compteur et alertes dédiés fournis.
Infrastructure client	Serveurs, réseau et certificats mis à disposition à J+5.	Liste de prérequis fournie dès le cadrage.
Validité de l'offre	30 jours à compter de sa remise.	-
